

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”



VecindApp

CONTROL DE AVANCES

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
03 de Octubre de 2025

AGENDA

01 Compromisos sesión anterior

02 Estado de avance

03 Principales riesgos

04 Revisión de compromisos

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado
1	Terminar Sprint 2	Javiera - Alex	26/09/2025	29/09/2025	Completado
2	Implementar avance de interfaz grafica de Gestión de Reservas	Javiera	26/09/2025	01/10/2025	Completado
3	Implementar la lógica en backend de que no puedan haber reservas duplicadas	Alex	26/09/2025	01/10/2025	Completado
4	Integrar pasarela de pago para realizar la reserva	Alex	26/09/2025	02/10/2025	Completado

ESTADO DE AVANCE

Fecha del reporte

03-10-2025

Fecha Inicio

05-09-2025

Fecha Fin


21-11-2025

Estado Actual

Avance Real	31.8 %
Avance Esperado	25.9 %
Desviación	+5.9 %
Estado	

Estado Anterior

Avance Real	27.3 %
Avance Esperado	11.3 %
Desviación	+16 %
Estado	

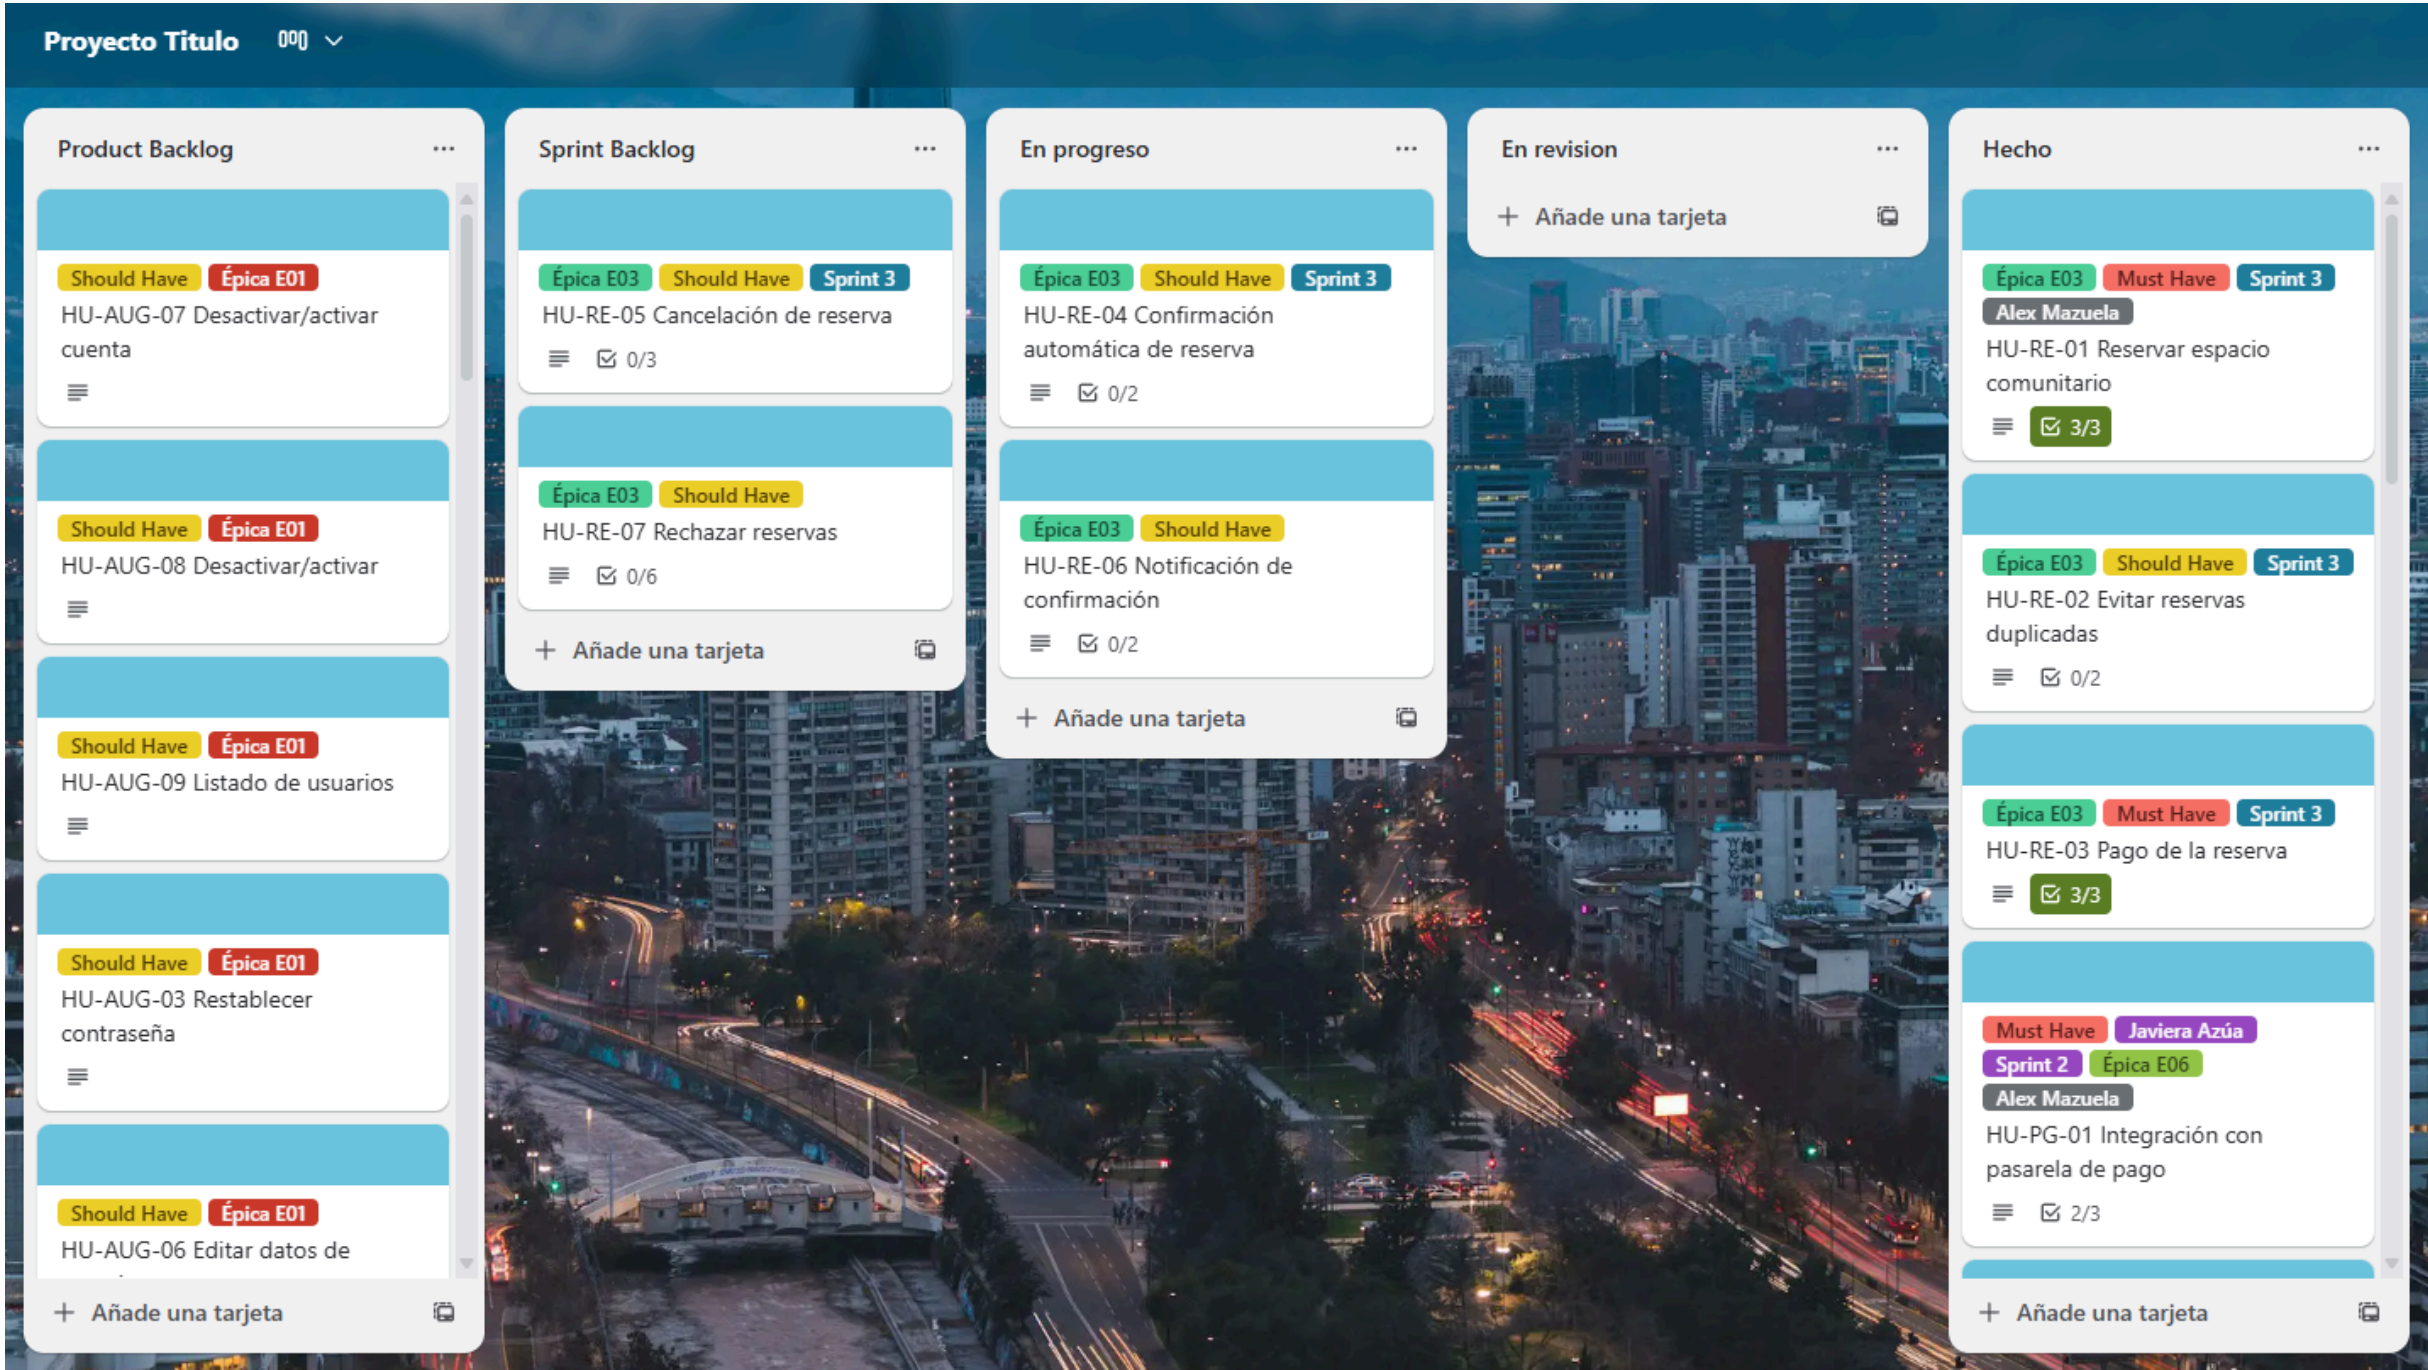

Logros	Explicación del desvío
- Implementar avance de interfaz grafica de Gestión de Reserva - Implementar la lógica en backend de que no puedan haber reservas duplicadas - Integrar pasarela de pago para realizar la reserva	- La desviación se explica por el buen trabajo en equipo, la priorización adecuada de tareas/sprints y porque algunas historias resultaron más fáciles de completar de lo esperado

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
03-10-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025


Estado Actual	
Avance Real	31.8 %
Avance Esperado	25.9 %
Desviación	+5.9 %
Estado	

Estado Anterior	
Avance Real	27.3 %
Avance Esperado	11.3 %
Desviación	+16 %
Estado	

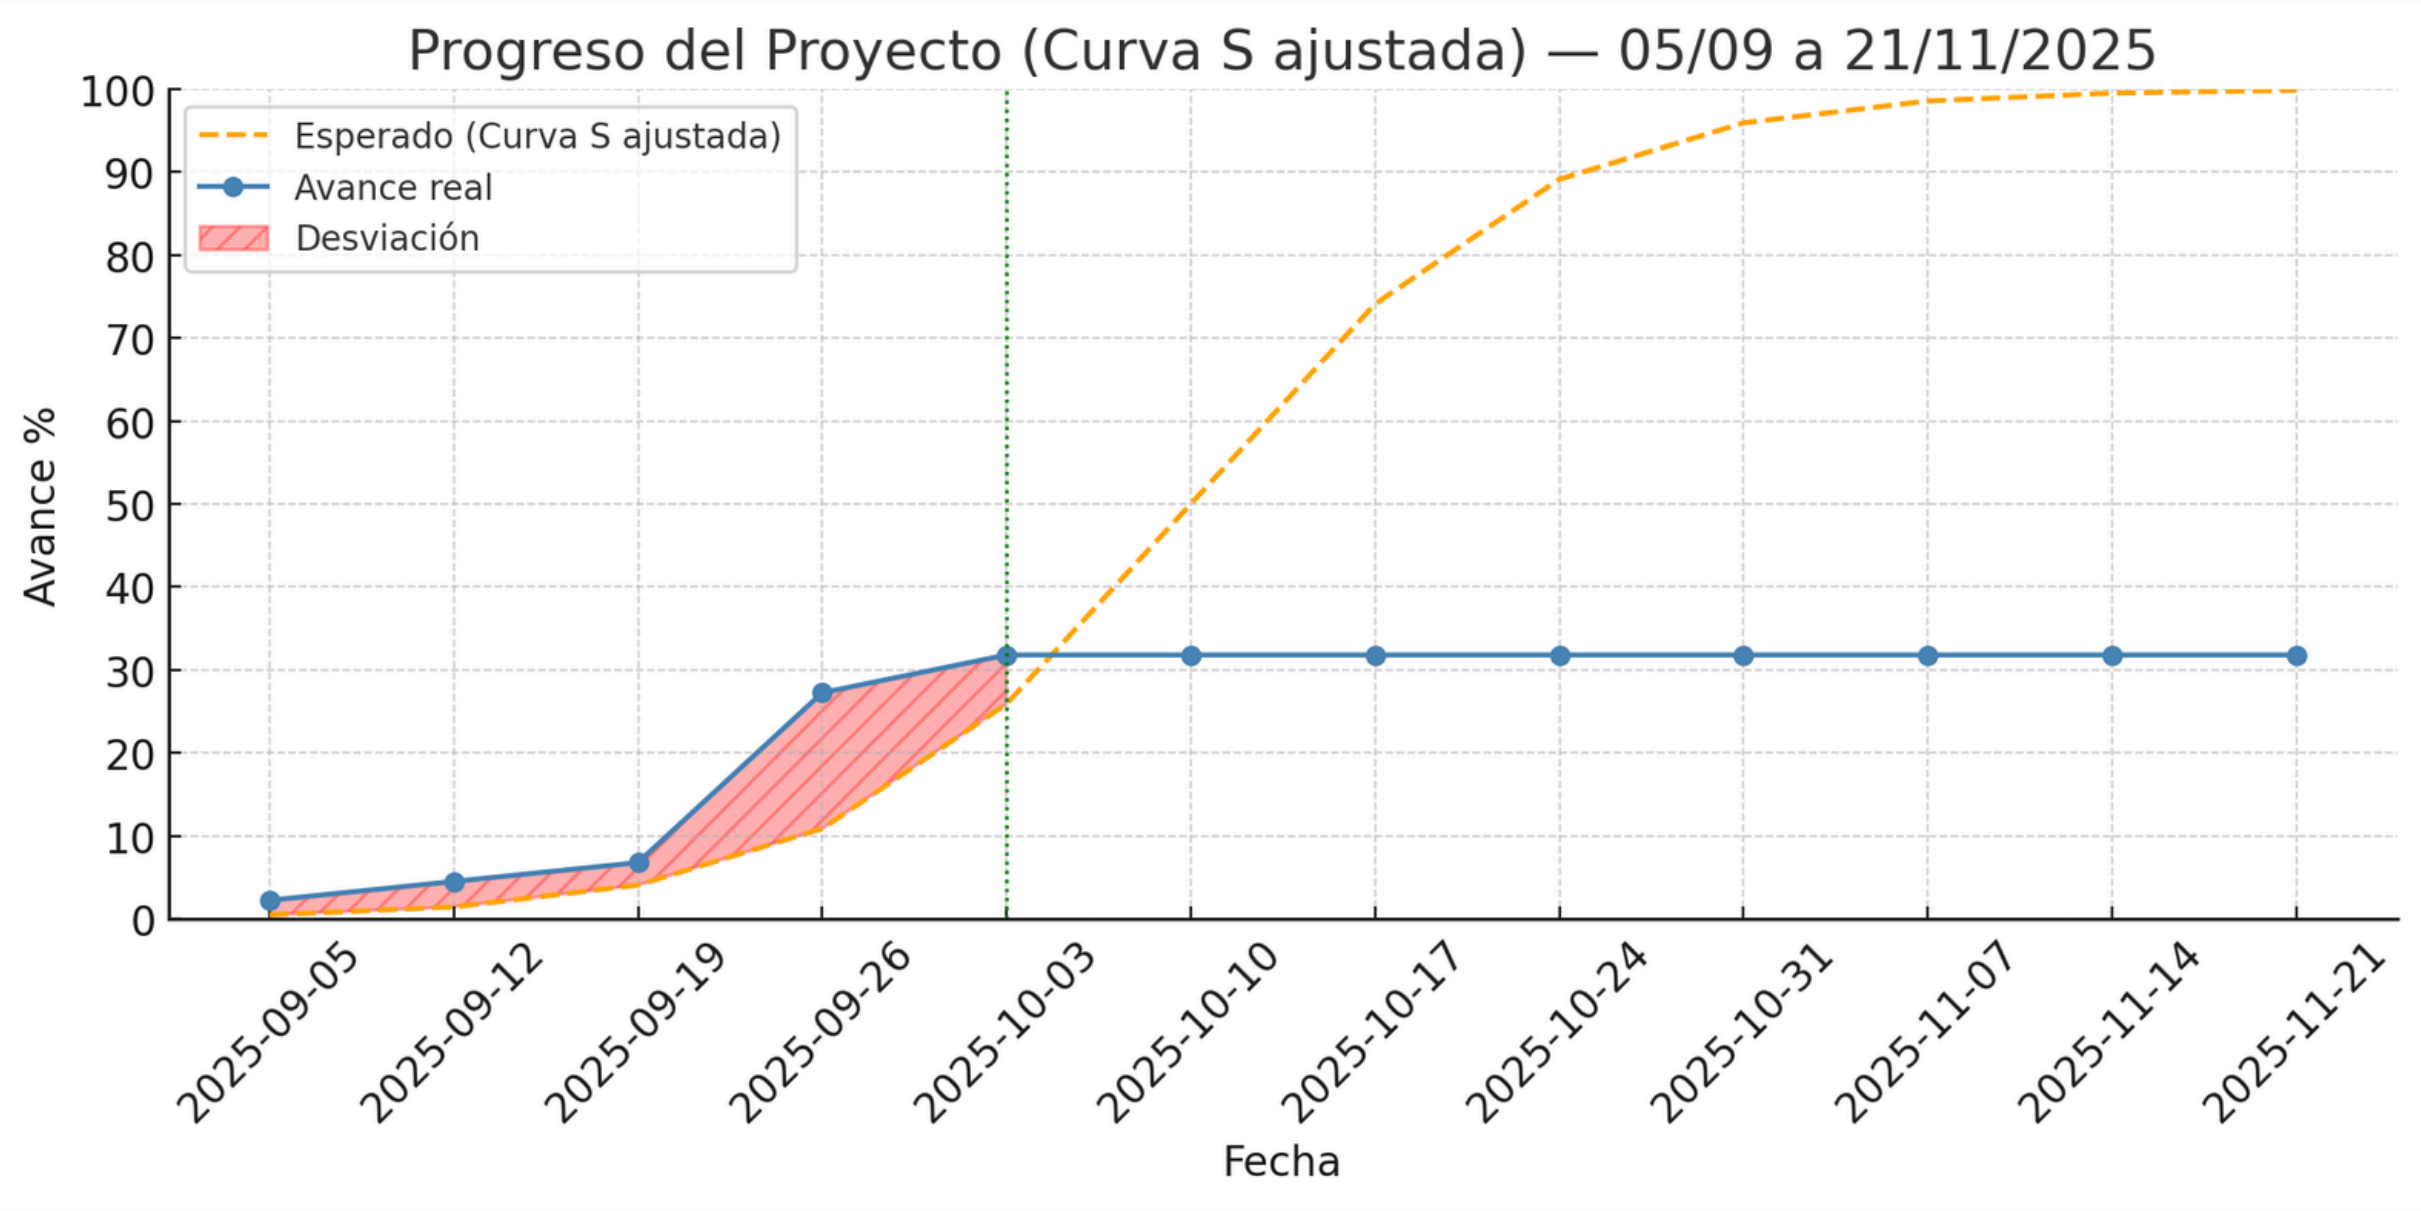

Logros	Explicación del desvío
- Implementar avance de interfaz grafica de Gestión de Reserva - Implementar la lógica en backend de que no puedan haber reservas duplicadas - Integrar pasarela de pago para realizar la reserva	- La desviación se explica por el buen trabajo en equipo, la priorización adecuada de tareas/sprints y porque algunas historias resultaron más fáciles de completar de lo esperado

RIESGOS ASOCIADOS

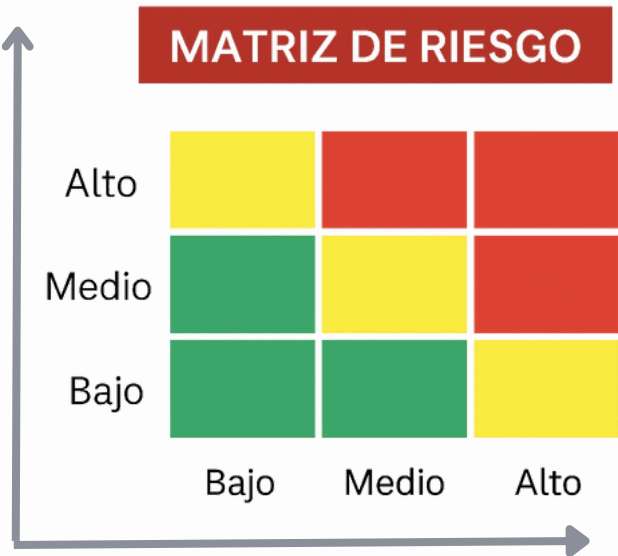

ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha cierre	Estado

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Confirmación automática de la reserva	Alex	03/10/2025	Posterior al pago el estado de la reserva debe pasar a “confirmada”.
2	Notificación de la confirmación	Javiera	03/10/2025	El usuario debe recibir una notificación de la reserva exitosa.
3	Cancelar una reserva	Alex	03/10/2025	El usuario debe poder cancelar una reserva.
4	Terminar el sprint 3	Javiera - Alex	03/10/2025	Comenzar a trabajar en las tareas definidas de este sprint.



VecindApp

!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
03 de Octubre de 2025
