

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”



VecindApp

**CONTROL DE
AVANCES**

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
10 de Octubre de 2025

AGENDA

01 Compromisos sesión anterior

02 Estado de avance

03 Principales riesgos

04 Revisión de compromisos

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado
1	Confirmación automática de la reserva	Javiera - Alex	03/10/2025	06/10/2025	Completado
2	Notificación de la confirmación	Javiera	03/10/2025	06/10/2025	Completado
3	Cancelar una reserva	Alex	03/10/2025	07/10/2025	Completado
4	Terminar el sprint 3	Javiera - Alex	03/10/2025	07/10/2025	Completado

ESTADO DE AVANCE

Fecha del reporte

10-10-2025

Fecha Inicio

05-09-2025

Fecha Fin


21-11-2025

Estado Actual

Avance Real	47.7 %
Avance Esperado	50.0 %
Desviación	-2.3 %
Estado	

Estado Anterior

Avance Real	31.8 %
Avance Esperado	25.9 %
Desviación	+5.9 %
Estado	

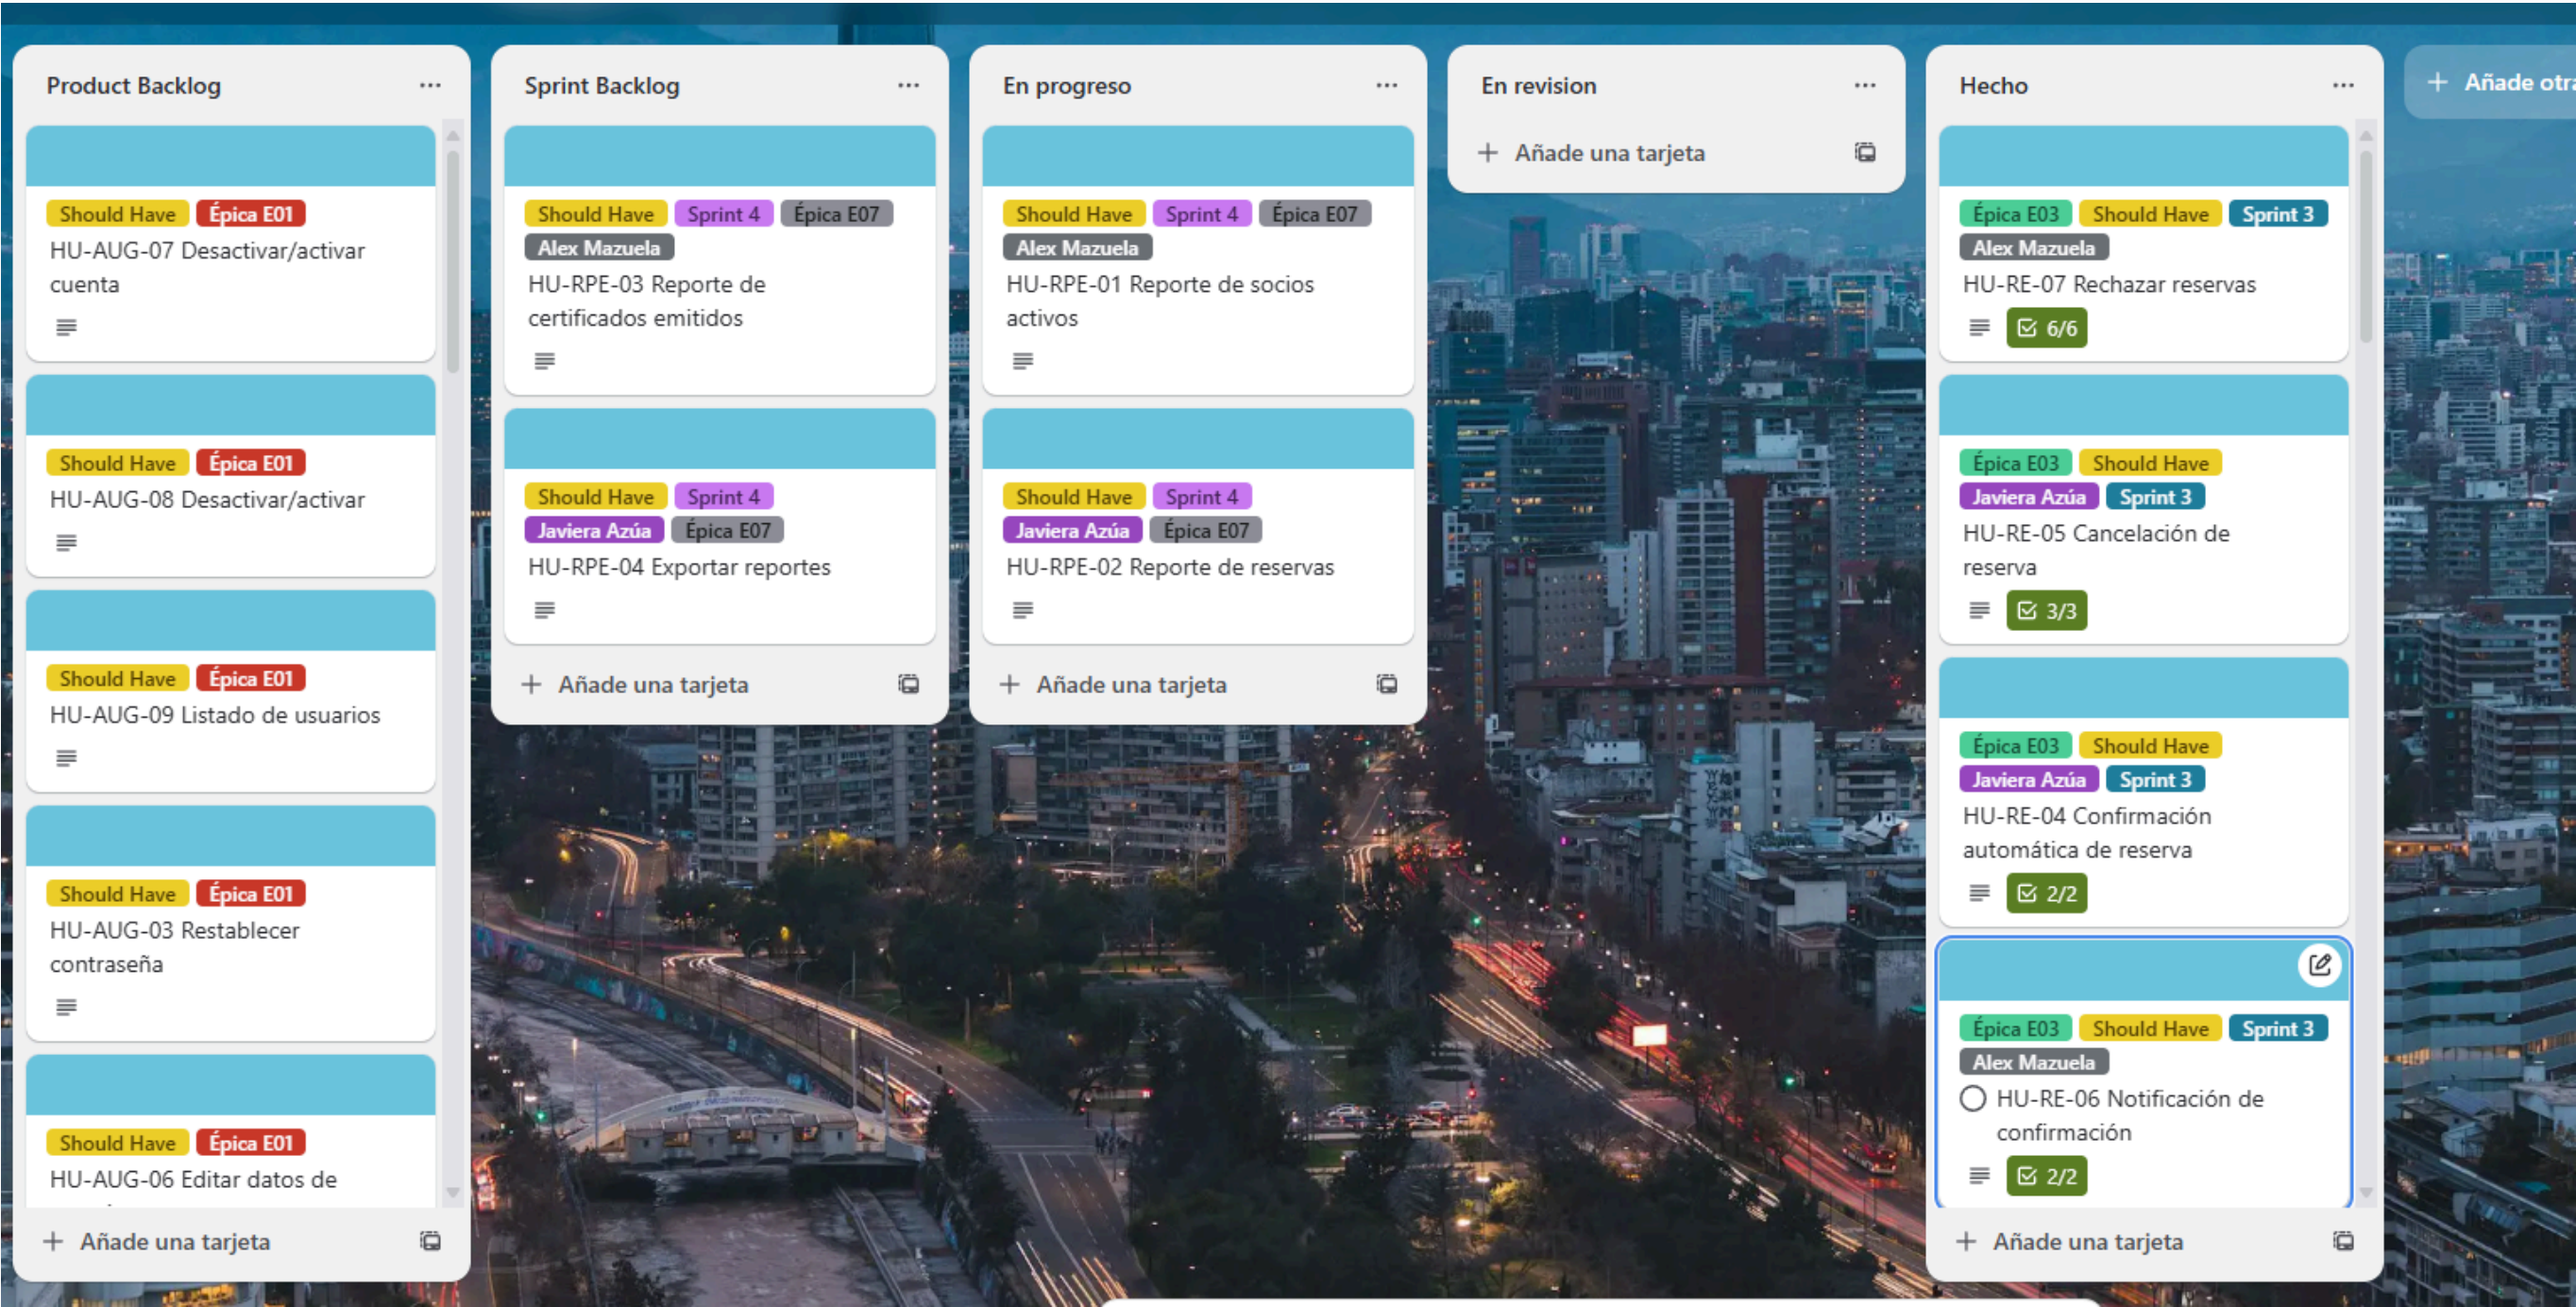

Logros

- Completar el modulo de la reserva mas la confirmación de la misma
- Cancelar las reservas
- Rechazar reservas por parte de la junta de vecinos

Explicación del desvío

- La desviación se explica por el buen trabajo en equipo, la priorización adecuada de tareas/sprints y porque algunas historias resultaron más fáciles de completar de lo esperado

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
10-10-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	47.7 %
Avance Esperado	50.0 %
Desviación	-2.3 %
Estado	


Estado Anterior	
Avance Real	31.8 %
Avance Esperado	25.9 %
Desviación	+5.9 %
Estado	

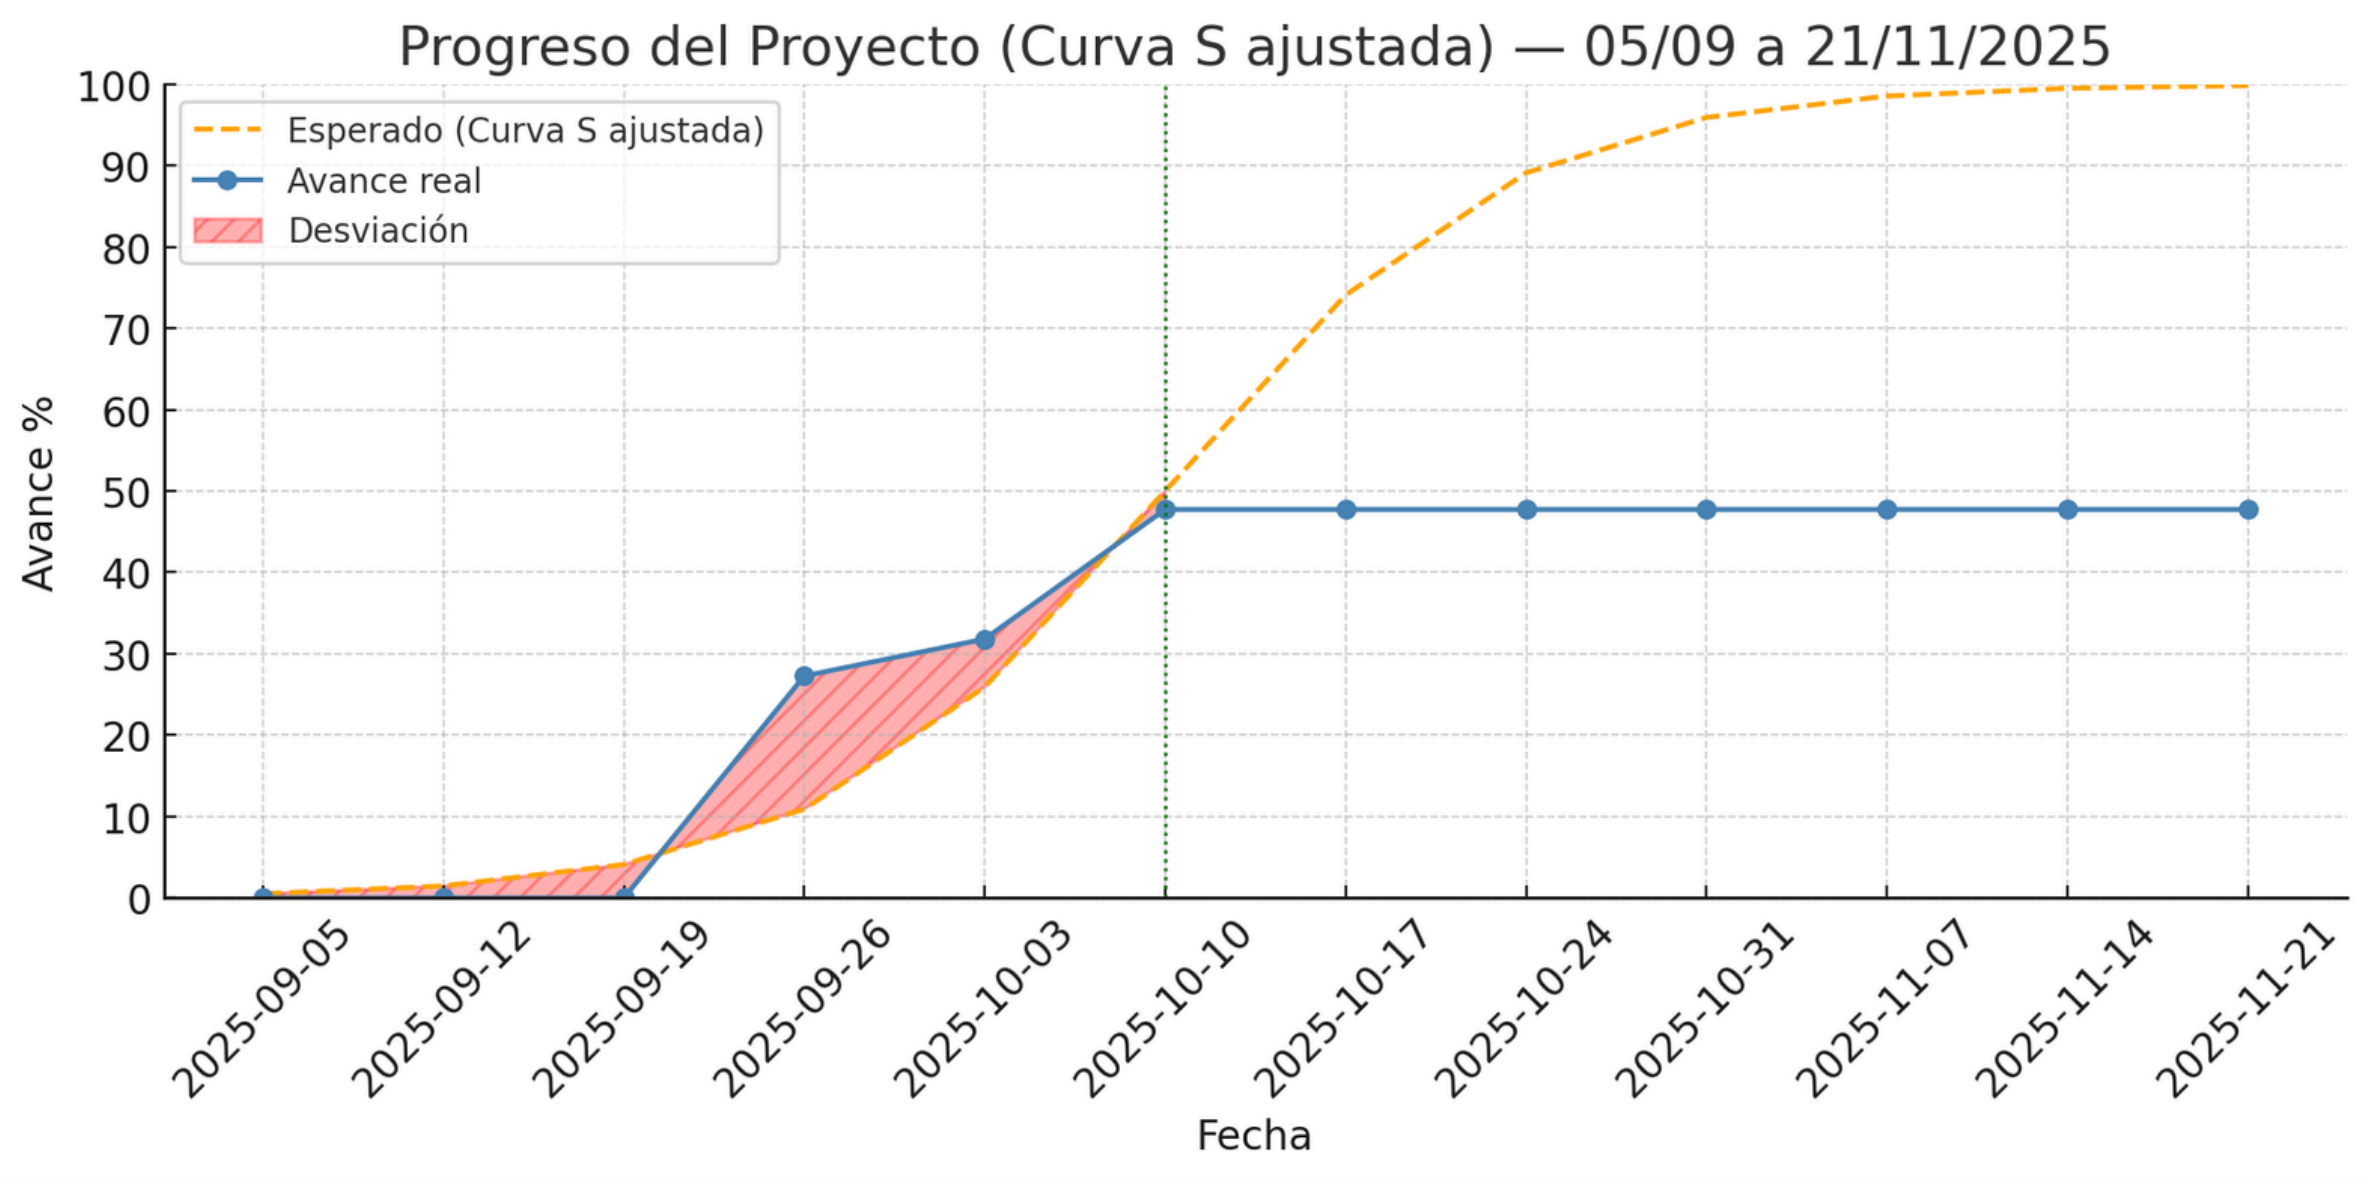

Logros	Explicación del desvío
• Completar el modulo de la reserva mas la confirmación de la misma • Cancelar las reservas • Rechazar reservas por parte de la junta de vecinos	- La desviación se explica por el buen trabajo en equipo, la priorización adecuada de tareas/sprints y porque algunas historias resultaron más fáciles de completar de lo esperado

FASE 1

RIESGOS ASOCIADOS

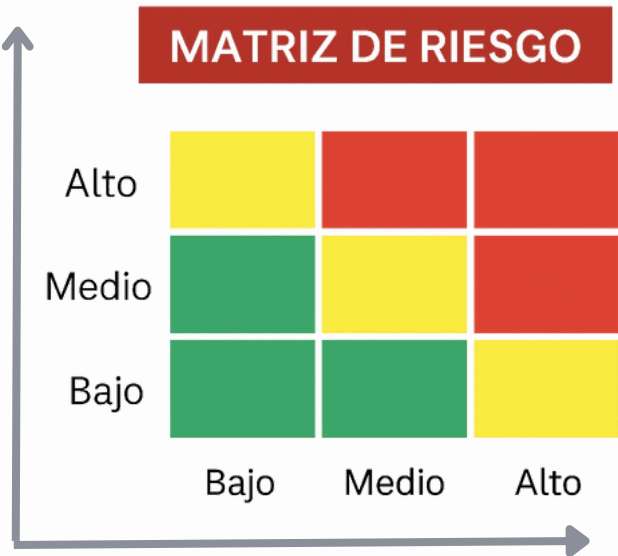

ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha cierre	Estado
01	Reservas en horarios no deseados	Medio	Refactorizar código que maneja la zona horaria	Alex - Javiera	07-10-2025	Cerrado

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Reporte de socios activos	Alex	10/10/2025	Debe mostrar la cantidad de socios activos de cada junta
2	Reporte de reservas	Javiera	10/10/2025	Debe mostrar todas las reservas
3	Reporte de certificados emitidos	Alex	10/10/2025	Numero de la cantidad de reportes
4	Exportar reportes	Alex	10/10/2025	Se debe poder exportar el reporte
5	Terminar Sprint 4	Javiera - Alex	10/10/2025	Completar en su totalidad las tareas definidas en este sprint



VecindApp

!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
10 de Octubre de 2025
