

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”



VecindApp

**CONTROL DE
AVANCES**

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
12 de Septiembre de 2025

AGENDA

01 Compromisos sesión anterior

02 Estado de avance

03 Principales riesgos

04 Revisión de compromisos

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado
1	Diseñar y validar el formulario de registro (campos: nombre, RUT, dirección, correo)	Javiera	05-09-2025	11-09-2025	Completado
2	Crear el formulario de inicio de sesión con campos para correo y contraseña.	Javiera	05-09-2025	10-09-2025	Completado
3	Implementar la validación de credenciales en el backend.	Alex	05-09-2025	10-09-2025	Completado
4	Crear la lógica para redirigir a los usuarios al panel de usuario tras un inicio de sesión exitoso	Alex	05-09-2025	10-09-2025	Completado

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
12-09-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	4.65 %
Avance Esperado	1.9 %
Desviación	+2.7 %
Estado	

Estado Anterior	
Avance Real	0 %
Avance Esperado	0 %
Desviación	0 %
Estado	

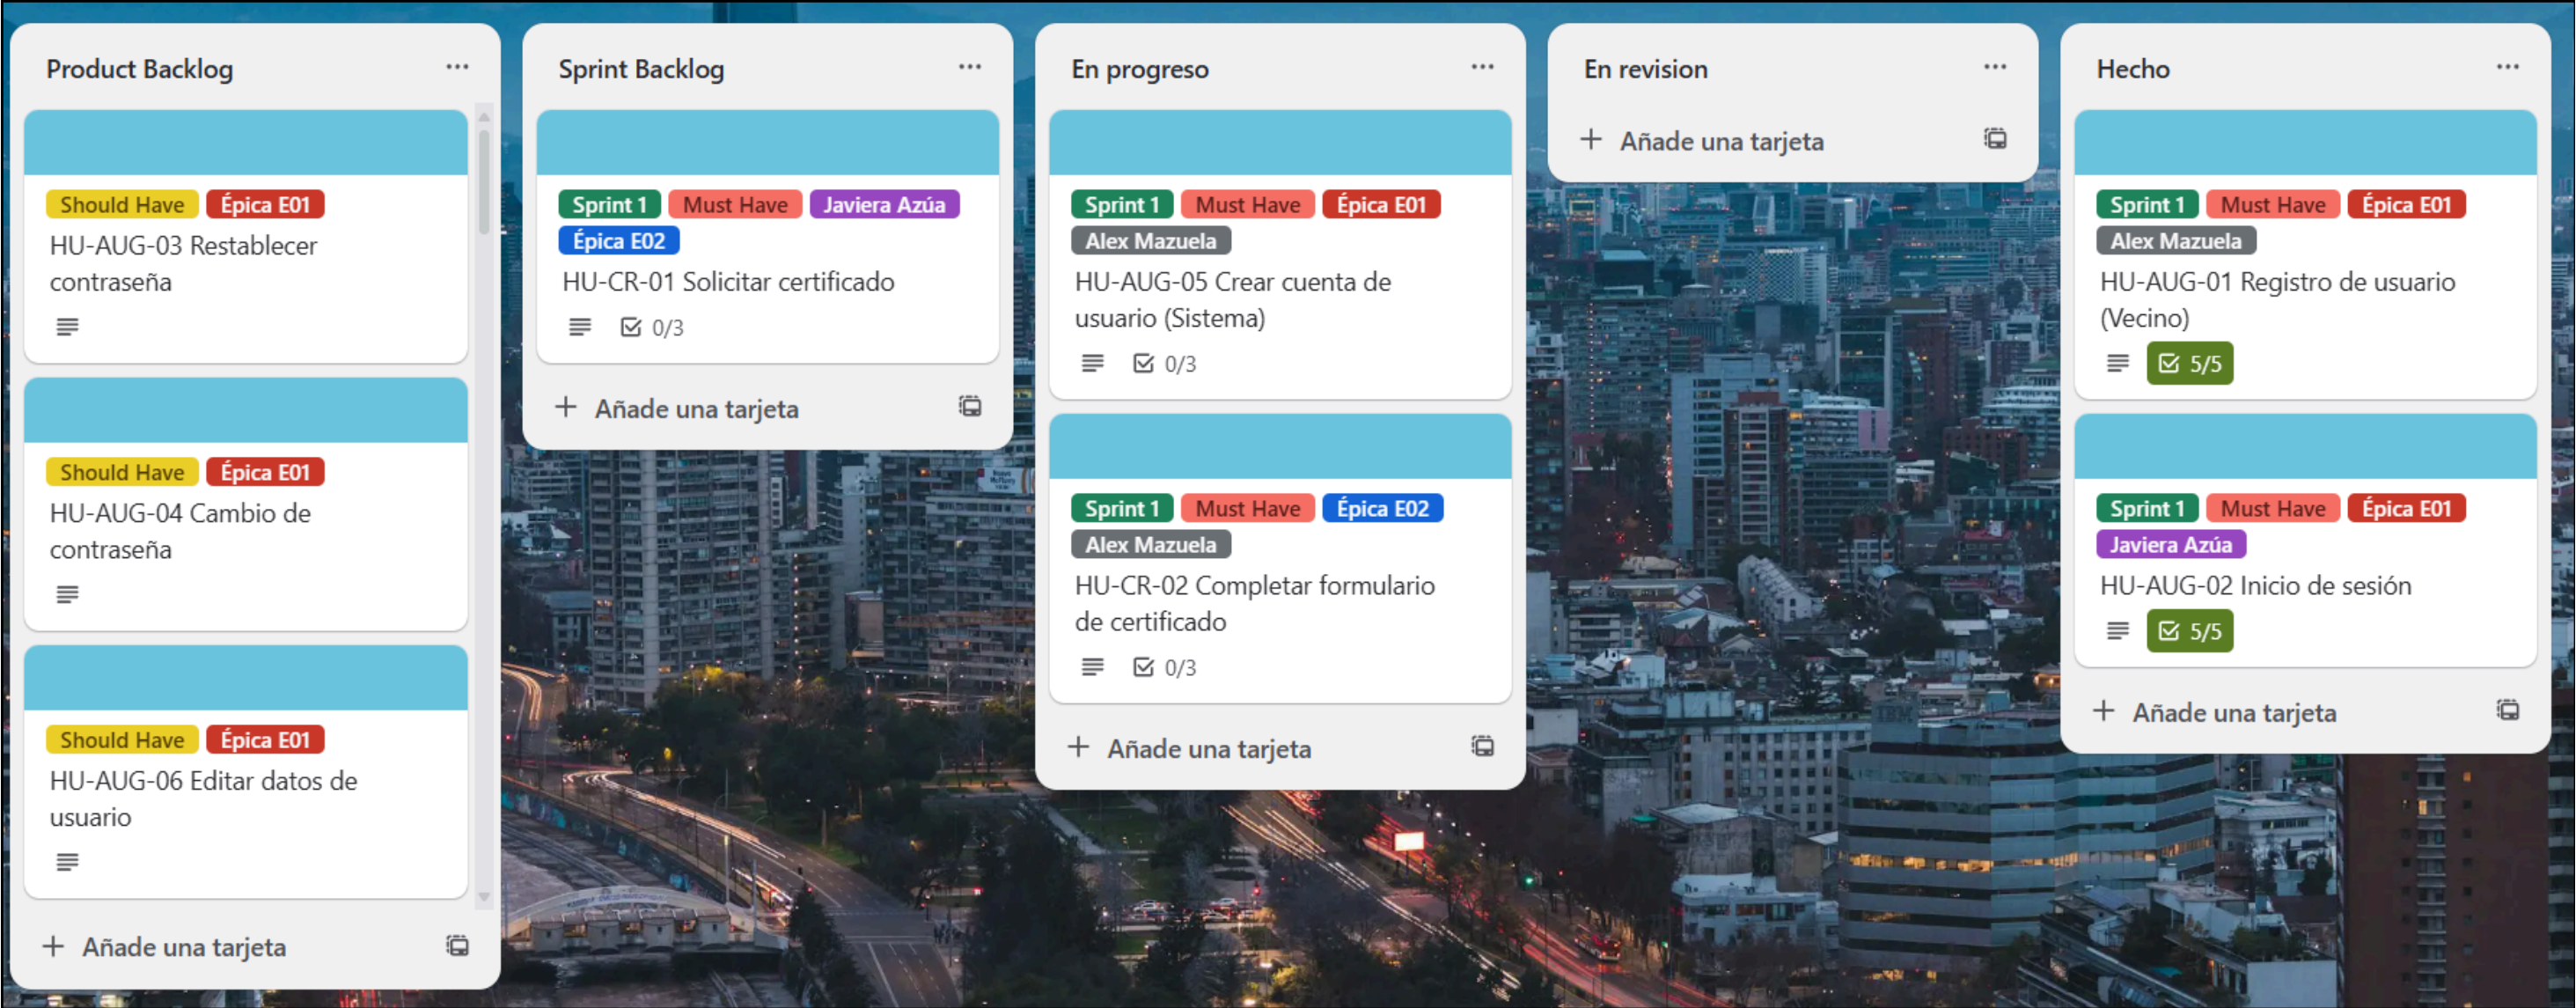

Logros	Explicación del desvío
- Diseñar y validar el formulario de registro - Implementar la validación del RUT y correo electrónico - Crear el formulario de inicio de sesión - Implementar la validación de credenciales en el backend - Crear la lógica para redirigir a los usuarios al panel de usuario tras un inicio de sesión exitoso	- Se priorizaron historias de usuario mas simples o conocidas pudiendo completarlas mas rápido de lo proyectado - Hubo una buena comunicación y gestión de roles entre los miembros del equipo

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
12-09-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	4.65 %
Avance Esperado	1.9 %
Desviación	+2.7 %
Estado	


Estado Anterior	
Avance Real	0 %
Avance Esperado	0 %
Desviación	0 %
Estado	

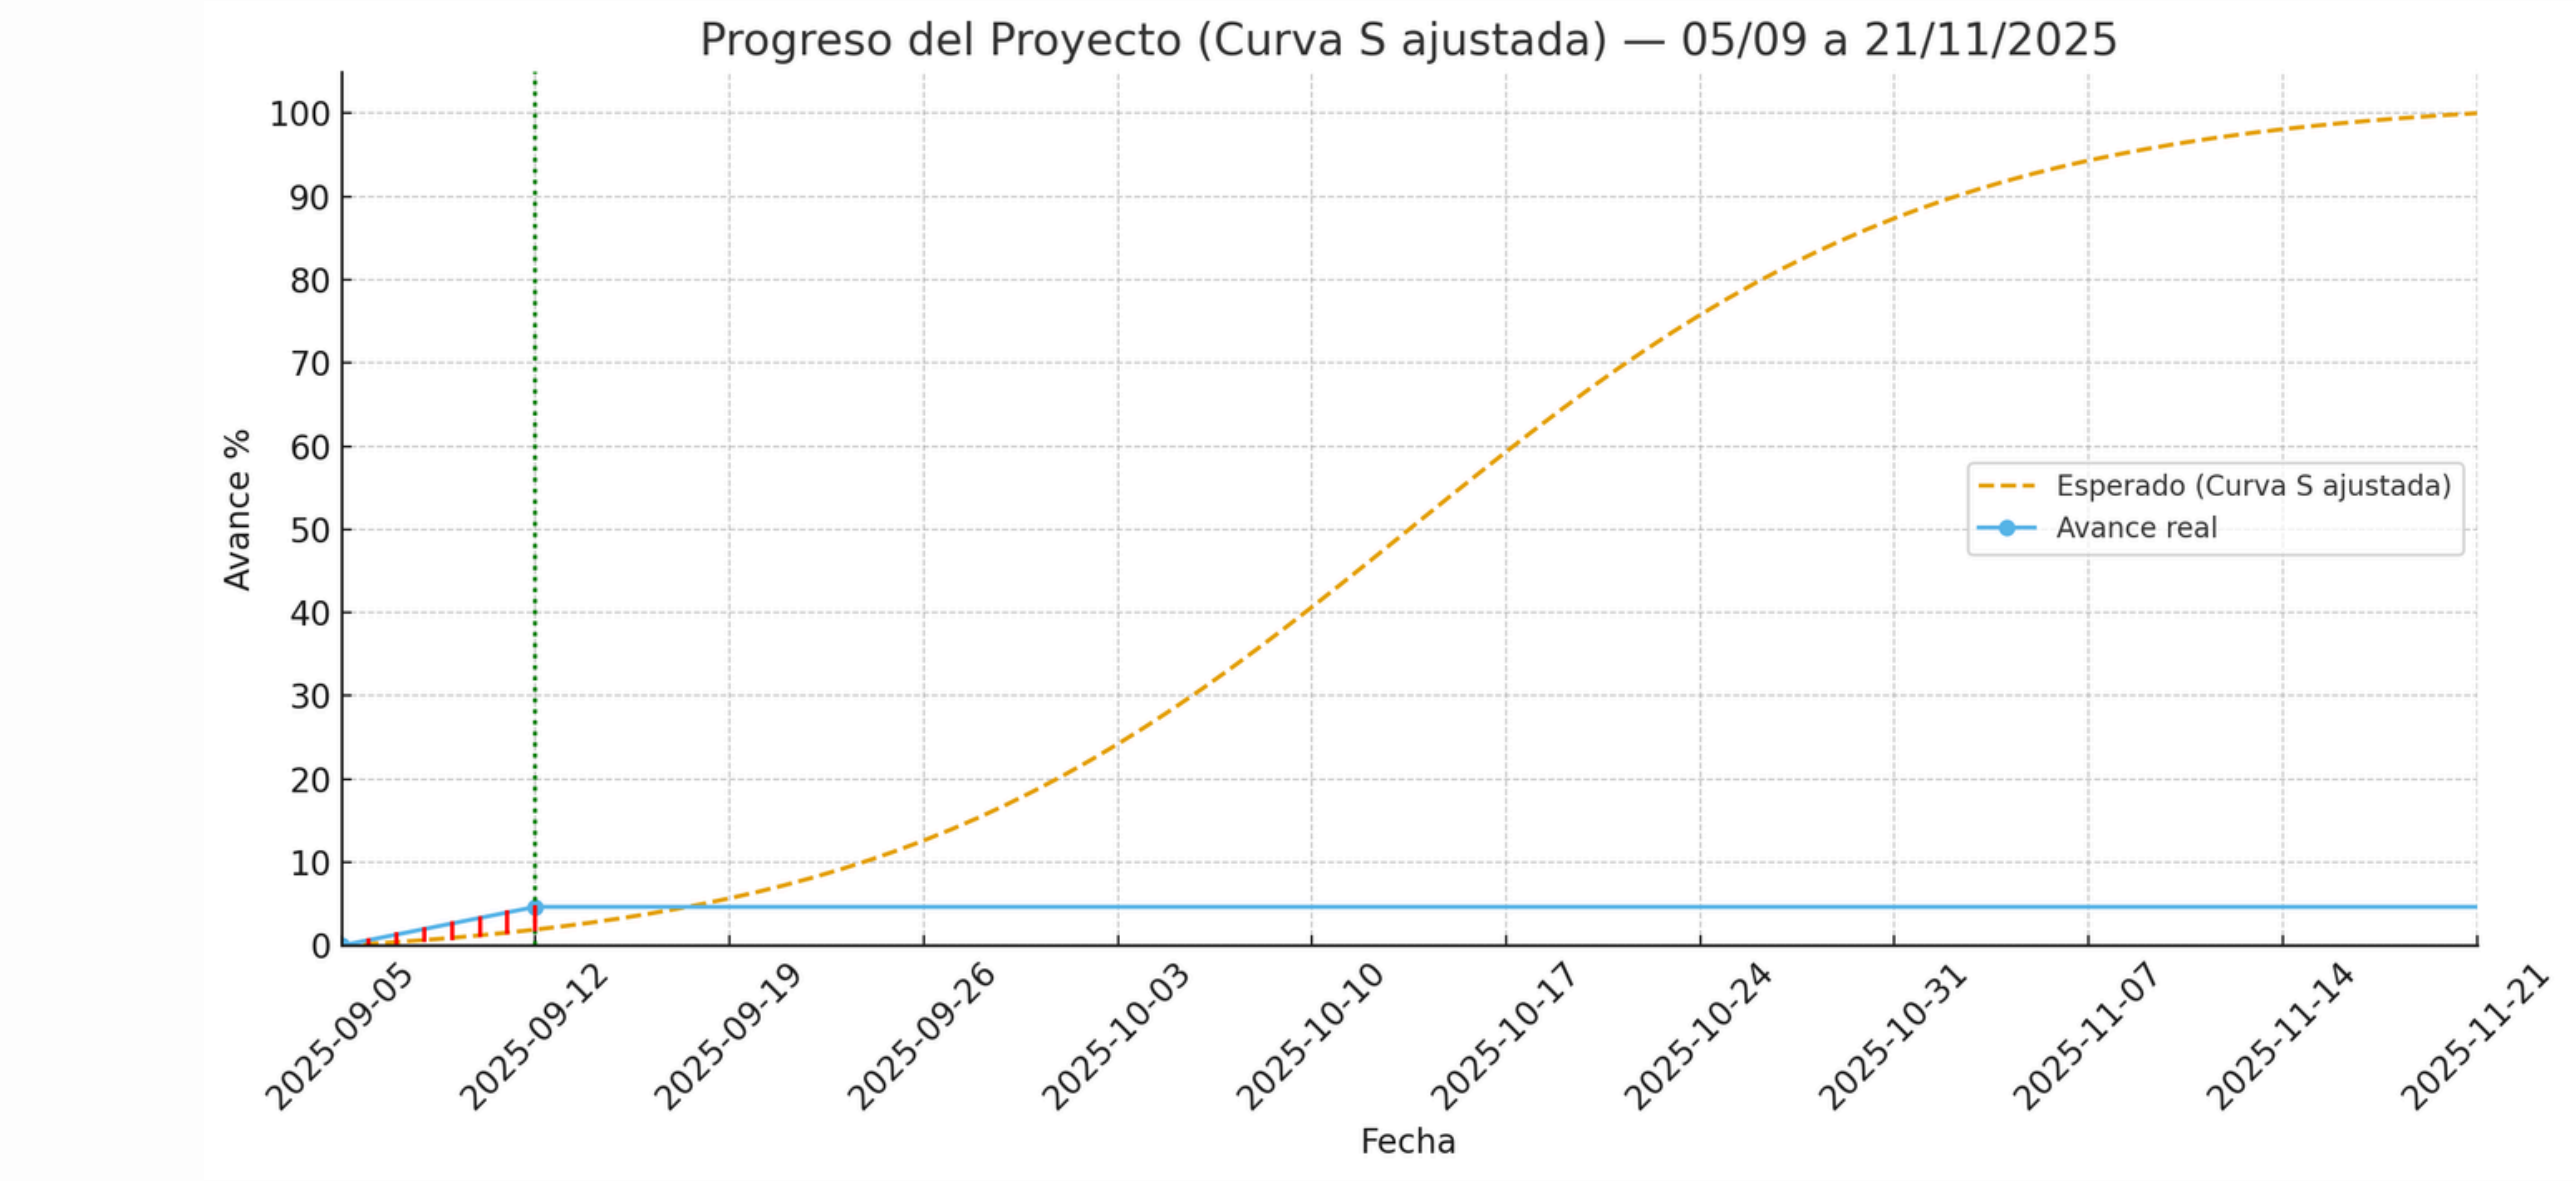

Logros	Explicación del desvío
- Diseñar y validar el formulario de registro - Implementar la validación del RUT y correo electrónico - Crear el formulario de inicio de sesión - Implementar la validación de credenciales en el backend - Crear la lógica para redirigir a los usuarios al panel de usuario tras un inicio de sesión exitoso	- Se priorizaron historias de usuario mas simples o conocidas pudiendo completarlas mas rápido de lo proyectado - Hubo una buena comunicación y gestión de roles entre los miembros del equipo

FASE 1

RIESGOS ASOCIADOS

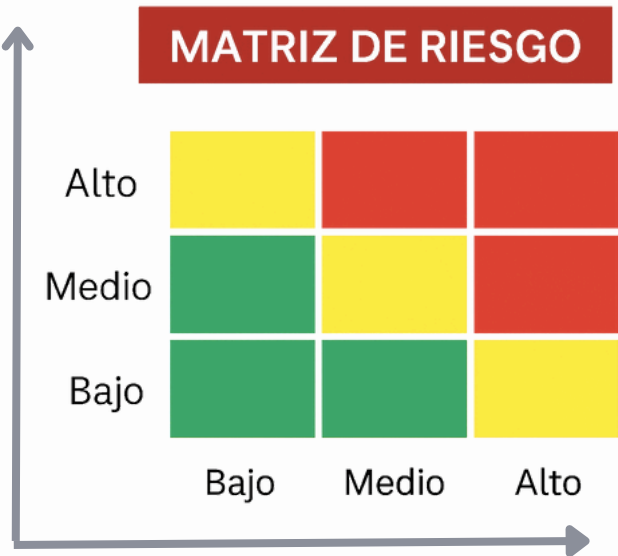

ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha cierre	Estado
1	Complicaciones por falta de experiencia con tailwind	Baja	Cambio a bootstrap	Javiera Azúa	09/09/2025	Cerrado
2	Problemas con generación de end point en el login	Medio	Revisar definición técnica y configuración del endpoint	Alex Mazuela	10/09/2025	Cerrado

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Diseñar la interfaz para que el admin pueda crear una cuenta de usuario	Javiera	12/09/2025	Interfaz lista y operativa para el admin
2	Configurar los permisos y roles para cada usuario creado (directiva, personal).	Alex	12/09/2025	Entregar roles definidos y aplicados al sistema
3	Crear una interfaz para que el socio pueda acceder al formulario de solicitud de certificado.	Javiera	12/09/2025	La interfaz debe estar operativa y lista
4	Implementar validación de los datos para asegurar que la información esté completa y correcta.	Alex	12/09/2025	Validaciones implementadas y probadas
5	Finalizar el sprint 1	Javiera - Alex	12/09/2025	Todos los compromisos deben estar cerrados



!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
12 de Septiembre de 2025
