

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”



VecindApp

CONTROL DE AVANCES

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
17 de Octubre de 2025

AGENDA

01 Compromisos sesión anterior

02 Estado de avance

03 Principales riesgos

04 Revisión de compromisos

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado
1	Reporte de socios activos	Alex	10/10/2025	17/10/2025	Completado
2	Reporte de reservas	Javiera	10/10/2025	17/10/2025	Completado
3	Reporte de certificados emitidos	Alex	10/10/2025	17/10/2025	Completado
4	Exportar reportes	Javiera	10/10/2025	17/10/2025	Completado
5	Terminar Sprint 4	Javiera - Alex	10/10/2025	17/10/2025	Completado

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
17-10-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	70.5 %
Avance Esperado	74.1 %
Desviación	-3.6 %
Estado	

Estado Anterior	
Avance Real	47.7 %
Avance Esperado	50.0 %
Desviación	-2.3 %
Estado	

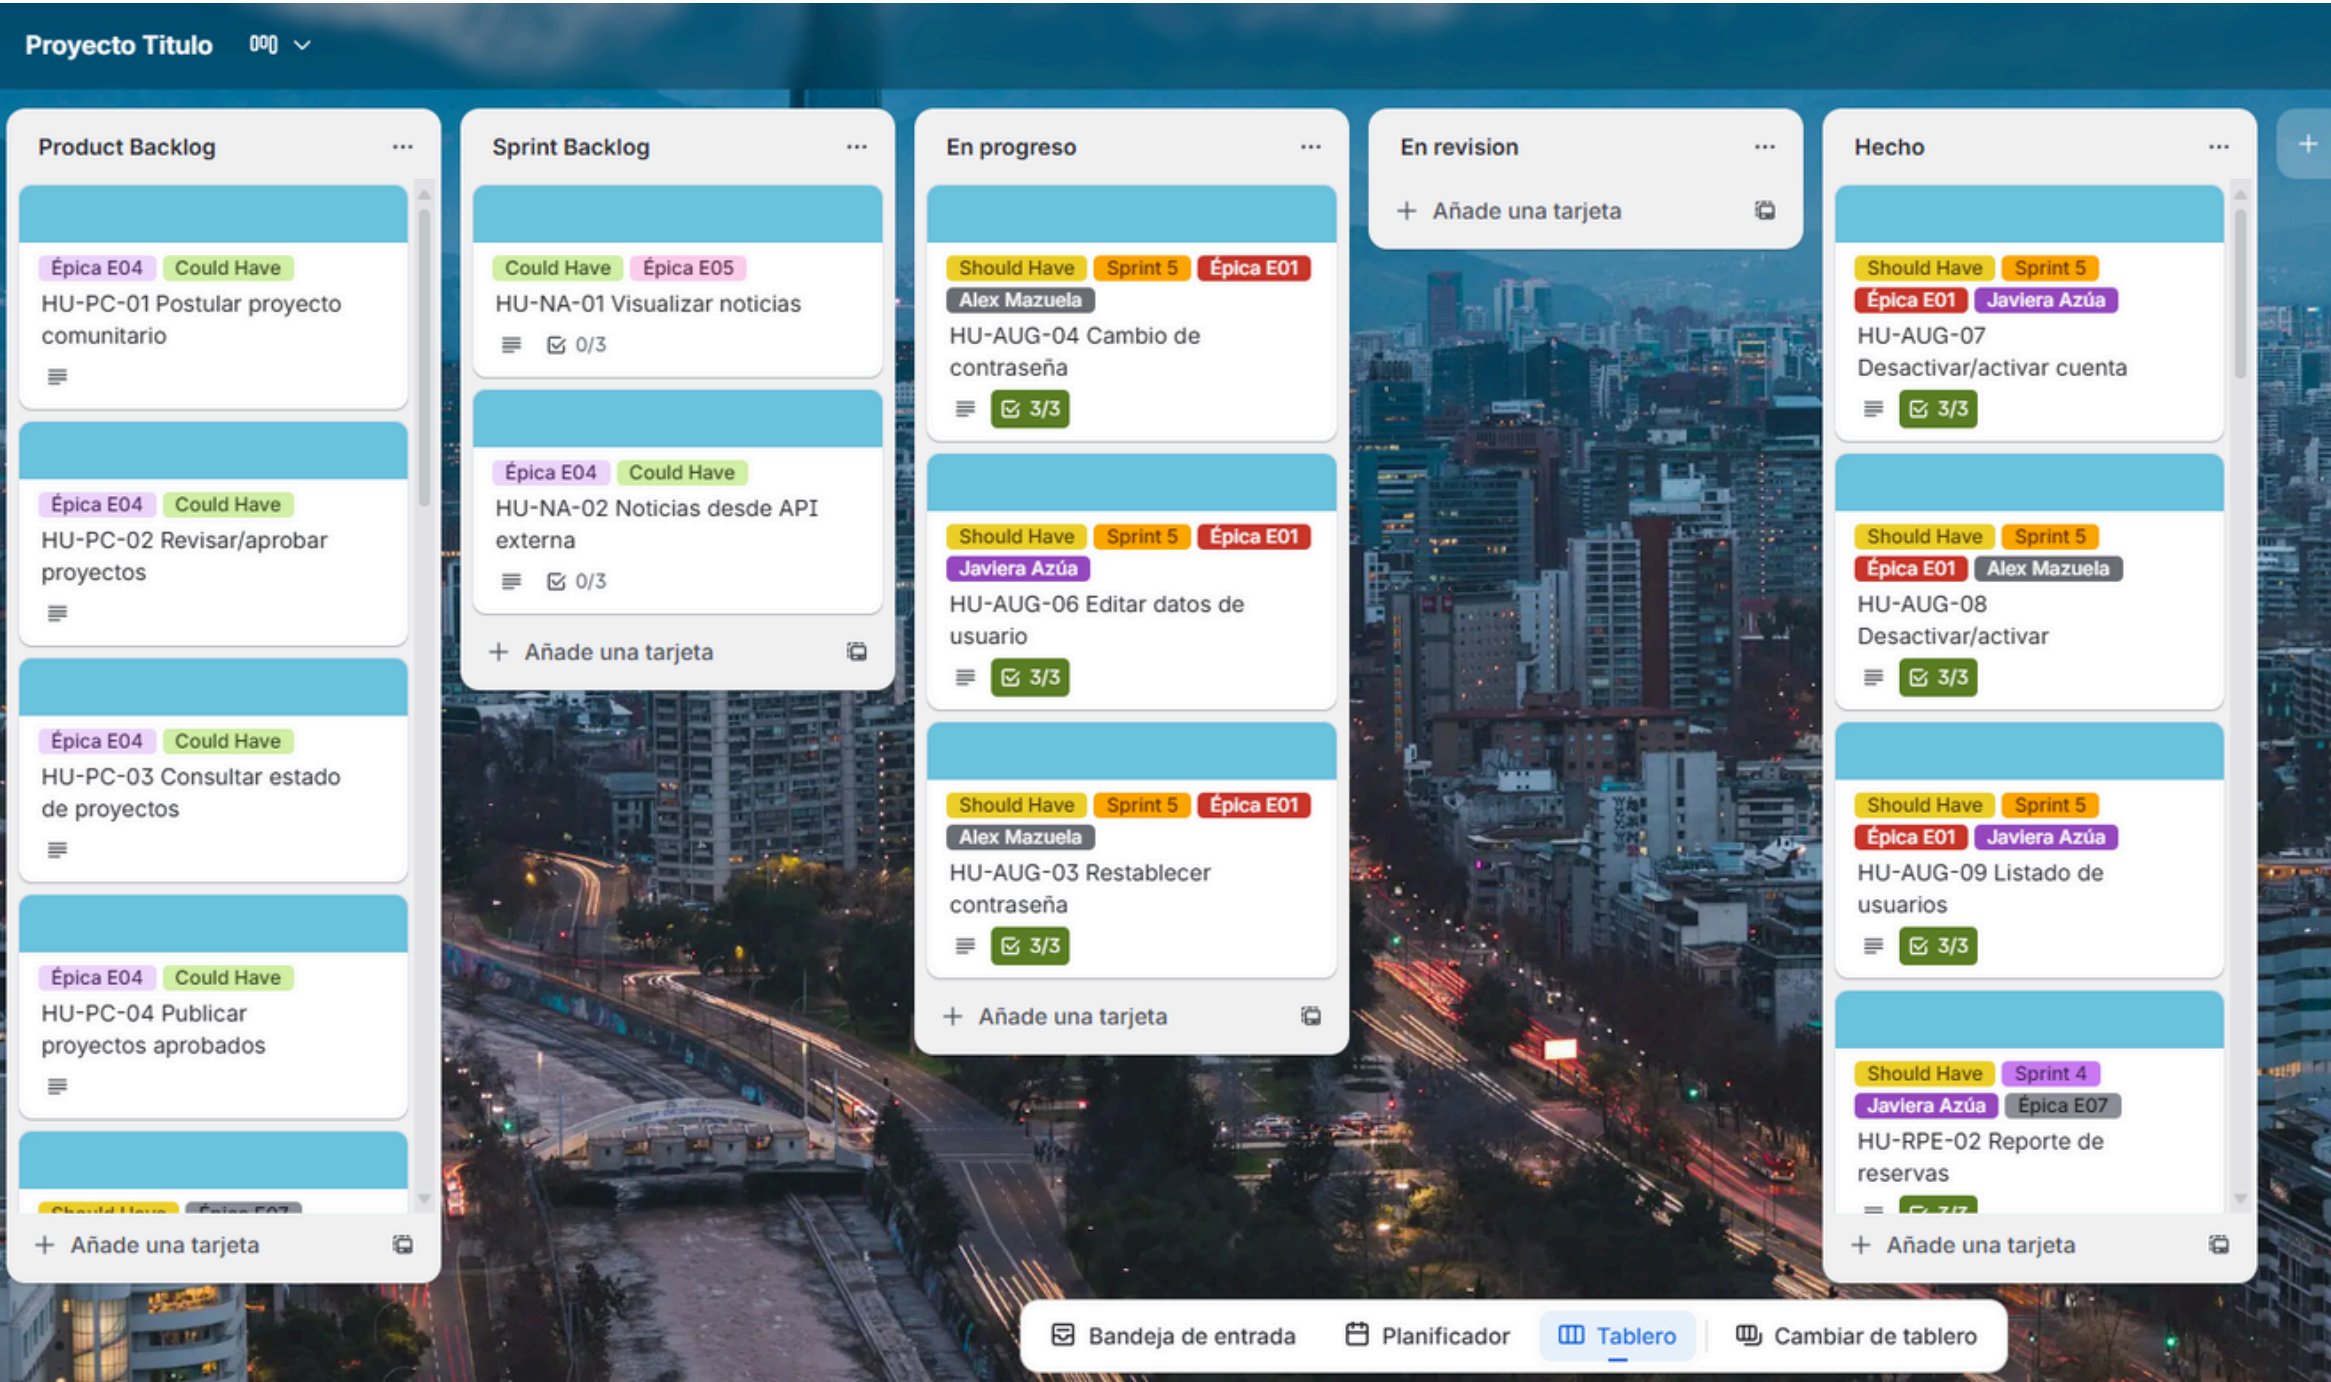

Logros	Explicación del desvío
• Completar el reporte de socios activos • Completar el reporte de reservas • Completar el reporte de reservas activas	- La desviación se debe a pequeños retrasos en la finalización de algunas historias, principalmente por ajustes en las prioridades del sprint y tareas que requirieron validaciones o pruebas adicionales. No representa un desvío crítico, el ritmo general del proyecto se mantiene estable.

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
17-10-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	70.5 %
Avance Esperado	74.1 %
Desviación	-3.6 %
Estado	


Estado Anterior	
Avance Real	47.7 %
Avance Esperado	50.0 %
Desviación	-2.3 %
Estado	

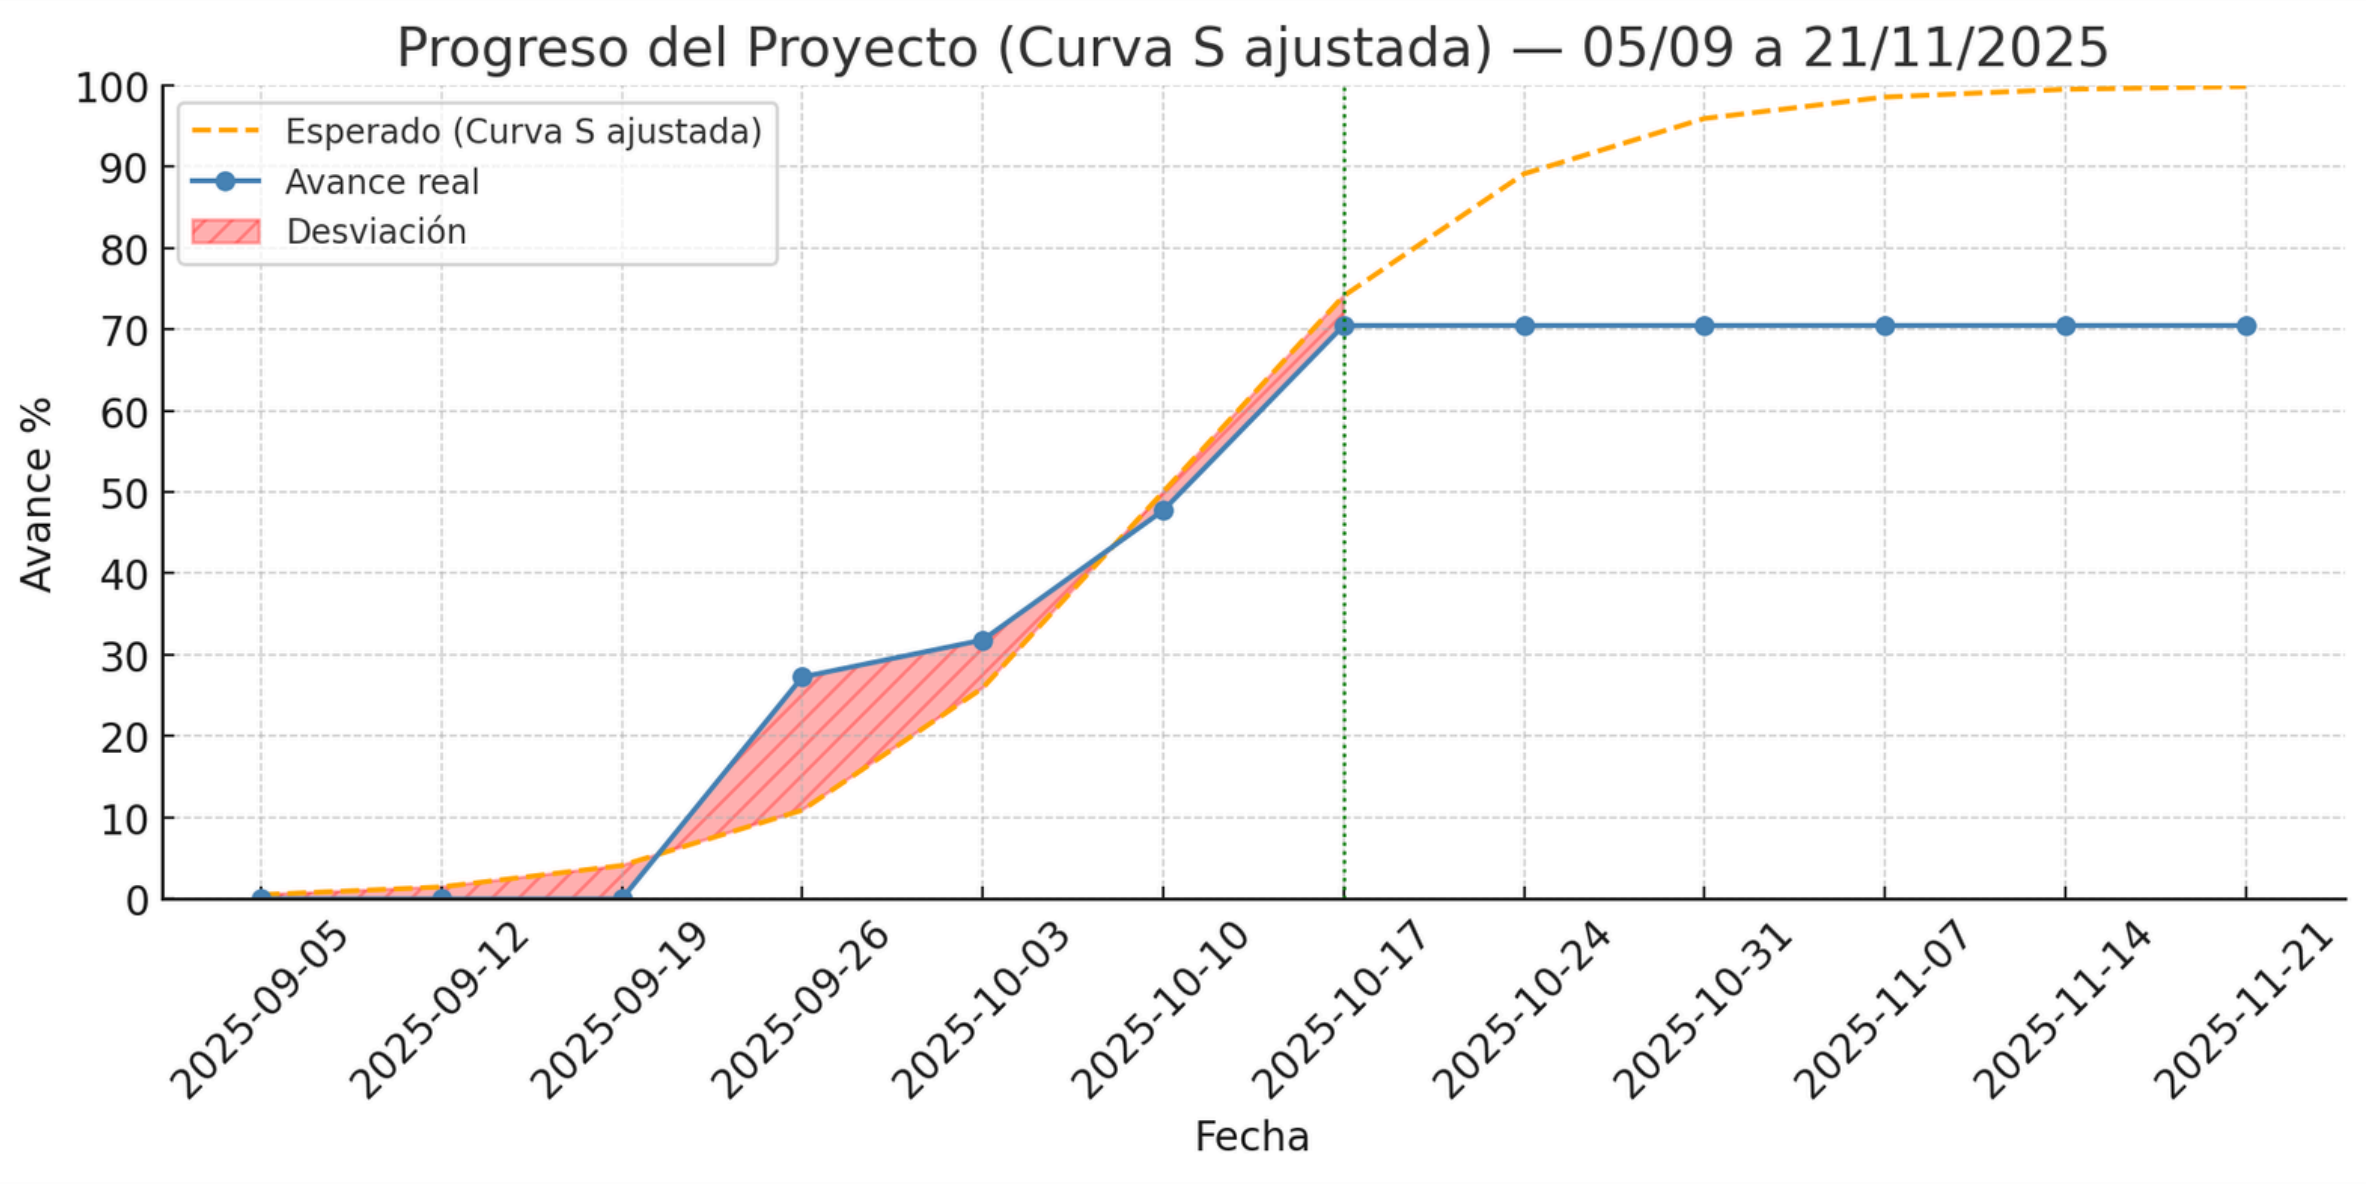

Logros	Explicación del desvío
• Completar el reporte de socios activos • Completar el reporte de reservas • Completar el reporte de reservas activas	- La desviación se debe a pequeños retrasos en la finalización de algunas historias, principalmente por ajustes en las prioridades del sprint y tareas que requirieron validaciones o pruebas adicionales. No representa un desvío crítico, el ritmo general del proyecto se mantiene estable.

FASE 2

RIESGOS ASOCIADOS

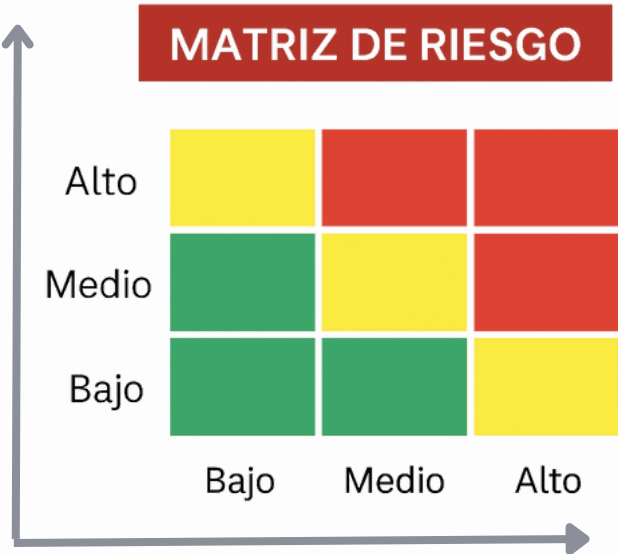

ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Cerrado
R-03	Retraso en el desarrollo de la aplicación móvil	Desarrollar una versión web responsiva que funcione correctamente en dispositivos móviles	Alex Mazuela - Javiera Azúa	Alcance / Plazo	15/11/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha cierre	Estado

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Visualizar noticias	Alex	17/10/2025	Completar la visualización de noticias en la interfaz principal.
2	Noticias desde API externa	Javiera	17/10/2025	API conectada y mostrando datos correctamente.
3	Preparar documentación solicitada	Alex	17/10/2025	Entregar la arquitectura del sistema basada en el modelo 4+1.
4	Terminar Sprint 5	Javiera - Alex	17/10/2025	Sprint finalizado con las tareas planificadas entregadas.
5	Comenzar desarrollo aplicacion móvil	Javiera - Alex	17/10/2025	Iniciar el desarrollo móvil con definición de estructura y entorno base.



VecindApp

!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
17 de Octubre de 2025
